

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Великоорусского сельского поселения
Калачинского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта:

Благоустройство территории мемориала павшим воинам ВОВ.

2. Место реализации проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: **Калачинский муниципальный район Омской области**.

2.2. Поселение: **Великорусское сельское поселение**.

2.3. Населенный пункт: **село Великоорусское**.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

3.1. Тип объекта: **благоустройство общественных территорий**.

3.2. Адрес объекта (при наличии): **ул. Кооперативная, д. 17А**,
с. Великоорусское, Калачинского района, Омской области.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

10 мая 2022 – 17 августа 2022.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 949 840,0	1 718 358,44	231 481,56	Экономия сложилась по результатам проведенных торгов
2	Средства местного бюджета	550 000,0	484 665,20	65 334,80	Экономия сложилась по результатам проведенных торгов
2.1	Собственные средства местного бюджета	200 000,0	134 665,20	65 334,80	Экономия сложилась по результатам

					проведенны х торгов
2.2	Инициативные платежи физических лиц	75 000,0	75000,0	0	По решению инициативной группы граждан
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	275 000,0	275 000,0	0	По решению инициативной группы граждан
Всего		2 499 840,0	2 203 023,64	296 816,36	

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Глава КФХ Вязе Виталий Владимирович	Предоставление техники для вывоза строительного мусора (Трактор МТЗ-80 с телегой)	шт.	1	4000,0
2	ИП Глава КФХ Никитин Александр Владимирович	Предоставление техники для погрузки строительного мусора (Трактор Беларусь с куном)	шт.	1	3500,0
3	ИП Глава КФХ Богунова Наталья Александровна	Предоставление техники для выкорчевки пней (Трактор Кировец)	шт.	1	2500,0

4	ИП Бичун Евгения Анатольевна	Луковицы цветочных растений для оформления клумб	шт.	50	2000,0
---	------------------------------	--	-----	----	--------

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Трубкина Галина Францевна	Проведение субботника по очистке территории мемориала от мусора, старой растительности и листьев.	Собрано более 19 куб. метров мусора
2	Глуздак Ольга Сергеевна		
3	Николюк Ирина Владимировна		
4	Вольф Елена Геннадьевна		
5	Рябишина Елена Викторовна		
6	Енина Зоя Петровна		
7	Лыскина Наталья Николаевна		
8	Лыскина Нина Васильевна		
9	Сергеева Юлия Викторовна		
10	Вяре Елена Сергеевна		
11	Исаева Елена Александровна		

12	Писаренко Марина Александровна		
13	Енин Виктор Анатольевич	Выпиловка старых и сухих деревьев	Очищено 50 кв. метров территории
14	Лыскин Александр Владимирович		
15	Сергеев Олег Викторович		
16	Ганке Александр Иванович		
17	Вяре Виталий Викторович	Погрузка мусора и веток	Погружено более 35 куб. метров мусора
18	Пелипас Никита Сергеевич		
19	Пугаченко Владимир Васильевич		
20	Никитин Александр Владимирович		
21	Бичун Сергей Павлович		
22	Максименко Елена Васильевна	Побелка и покраска малых архитектурных форм и именных плит	Побелено 52 кв. метра
23	Лыскина Елена Викторовна		
24	Малюк Людмила Владислаовна	Высадка цветочных растений	Высажено 50 луковиц многолетних цветов (лилейник и тюльпаны)
25	Делеско Тамара Григорьевна		
26	Петрова Татьяна Анатольевна		
27	Керн Анна Ивановна		
28	Лыскина Людмила Анатольевна		
29	Дементьева Татьяна Семеновна		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

На основании постановления Правительства Омской области № 43-п от 10.02.2022 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на софинансирование инициативных проектов в 2022 году» Администрацией Великоорусского сельского поселения Калачинского муниципального района по результатам электронных торгов был заключен муниципальный контракт № 1 от 04.05.2022 с ООО «ИмперияСтрой» на выполнение работ по благоустройству территории мемориала павшим воинам ВОВ, расположенной по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Великоорусское, ул. Кооперативная, д. 17А

В ходе исполнения контракта подрядчиком были выполнены работы по установке бортовых камней, выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев из строительного песка, уложена тротуарная плитка (900 кв. м), установлены фонари уличные Сити-400 (14 шт.) и лавочки (3 шт.), высажены саженцы колючей ели (6 шт.) и кусты барбариса (20 шт.)

В реализации инициативного проекта приняли трудовое участие 29 граждан. Проведен субботник по очистке территории мемориала от мусора, старой растительности и листьев, произведена выпиловка старых и сухих деревьев, побелены и покрашены малые архитектурные формы и именные плиты.

В нефинансовой форме реализации проекта инициативного бюджетирования приняли участие и индивидуальные предприниматели:

ИП Главы КФХ Вяре В.В. и Никитин А.В. предоставили трактора для вывоза и погрузки строительного мусора, ИП Глава КФХ Богунова Н.А. – для выкорчевки пней. ИП Бичун Е.А. предоставила луковицы многолетних цветочных растений.

Активную помощь при сборе средств на софинансирование проекта

инициативного бюджетирования гражданами оказали депутаты Совета
Великорусского сельского поселения.

Приложение:

1. Фотоматериалы этапов ремонта территории мемориала на 10-ти листах.

Глава Великорусского сельского
поселения Калачинского
муниципального района
Омской области




С.А. Бичун

«08» сентября 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проведение субботника по очистке территории мемориала от мусора, старой растительности и листьев.

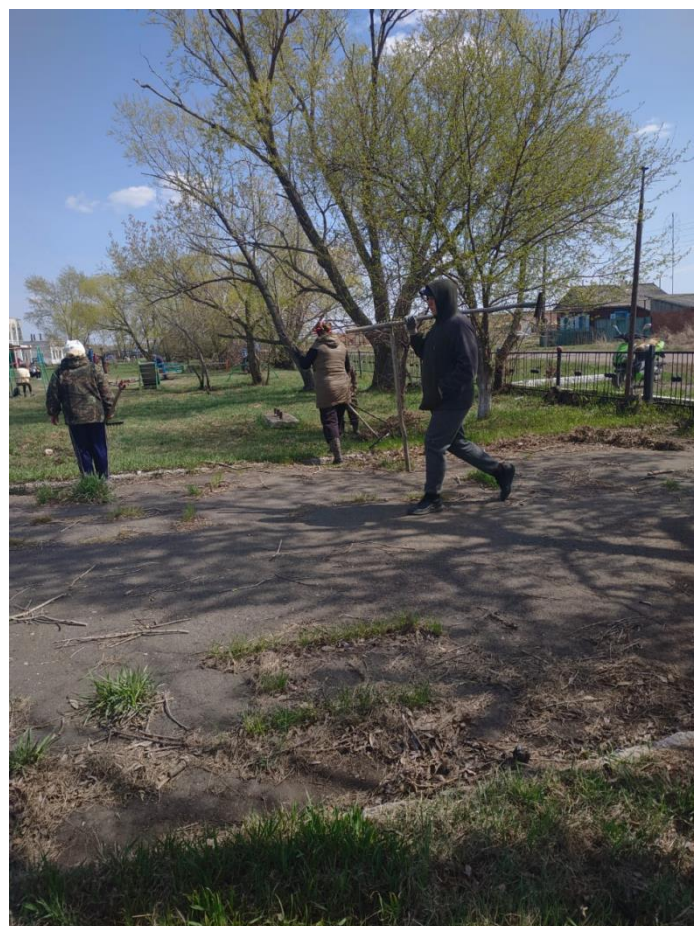



Выпиловка старых и сухих деревьев



Побелка и покраска малых архитектурных форм и именных плит



Ход работы по благоустройству мемориала





Итоги работ по благоустройству территории мемориала павшим воинам ВОВ







